ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Analisi del rischio (AR)**	**19 g**	**27/10**	**20/11**
2	Analisi documentazione	5 g	27/10	31/10
3	Interviste	3 g	03/11	05/11
4	**Analisi e documentazione (A1:A8)**	**11 g**	**06/11**	**20/11**
5	Documento di analisi del rischio	5 g	06/11	12/11
6	Documento su piano trattamento	3 g	13/11	17/11
7	Documento su rischio residuo	3 g	18/11	20/11
8	**Vulnerability Assessment (VA)**	**13 g**	**21/11**	**10/12**
9	Progettazione	3 g	21/11	25/11
10	**Esercizio**	**12 g**	**24/11**	**10/12**
11	Set-up ambiente	1 g	24/11	24/11
12	Esecuzione (B1:B5)	7 g	25/11	03/12
13	Analisi dei risultati e documentazione	4 g	04/12	10/12
14	**Assessment**	**38 g**	**30/10**	**23/12**
15	Progettazione intervento (T1)	5 g	30/10	05/11
16	Preparazione linee guida (T2)	9 g	05/11	17/11
17	Analisi documentale (T3)	4 g	19/11	24/11
18	Monitoraggio VA (T4)	5 g	25/11	01/12
19	Raccolta evidenze (T5)	4 g	05/12	11/12
20	Rapporto (T6)	7 g	15/12	23/12
21	**Management**	**39 g**	**28/10**	**22/12**
22	Kick-off	1 g	28/10	28/10
23	SAL 1	1 g	20/11	20/11
24	SAL 2	1 g	11/12	11/12
25	Fine lavori	1 g	22/12	22/12

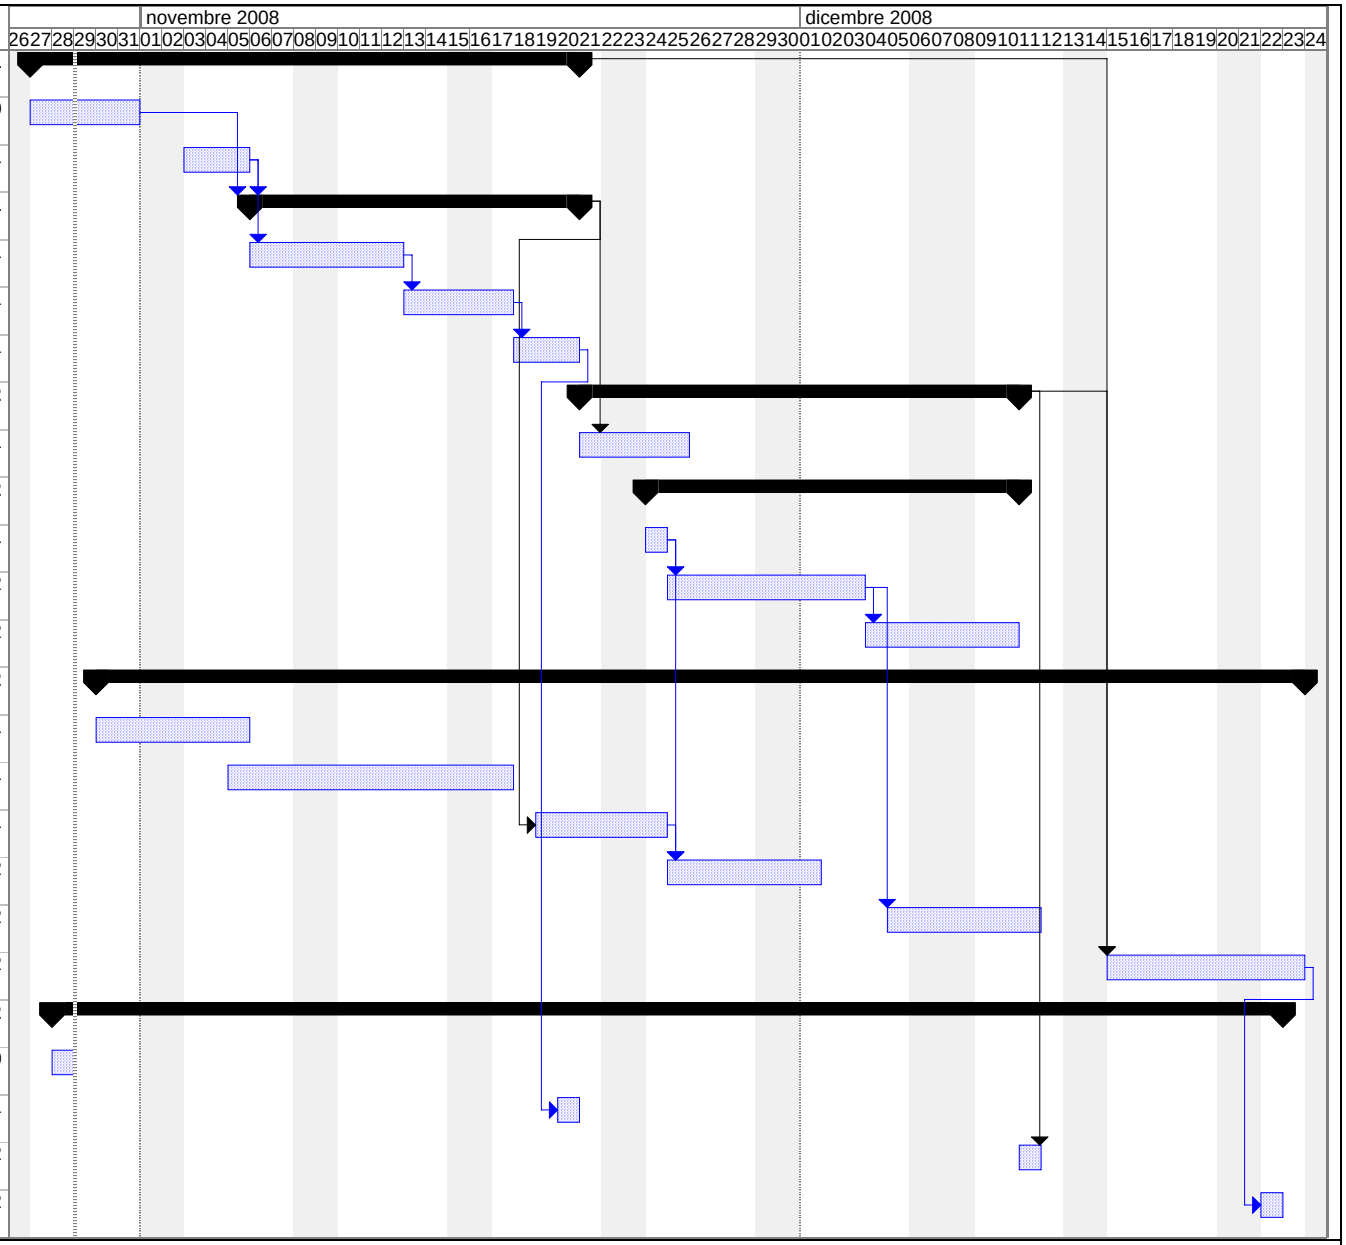

Progetto: MSProj11
Data: 29/10

Attività		Cardine		Divisione	
Divisione		Riepilogo		Avanzamento	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Cardine	
